賀茂環境衛生センター解体工事の進捗状況について

（令和5年12月末現在）

1　全体スケジュール（計画・実績）

賀茂環境衛生センター解体工事は、令和４年度に着手し、令和７年度中に完了する予定です。
令和５年３月から仮設工事に着手し、令和５年５月から各種汚染物の除去作業を行った後、建物内の設備を解体し、順次、建物、煙突の解体を行い、基礎・杭の解体・除去、埋戻し作業、外構工事と行う計画です。

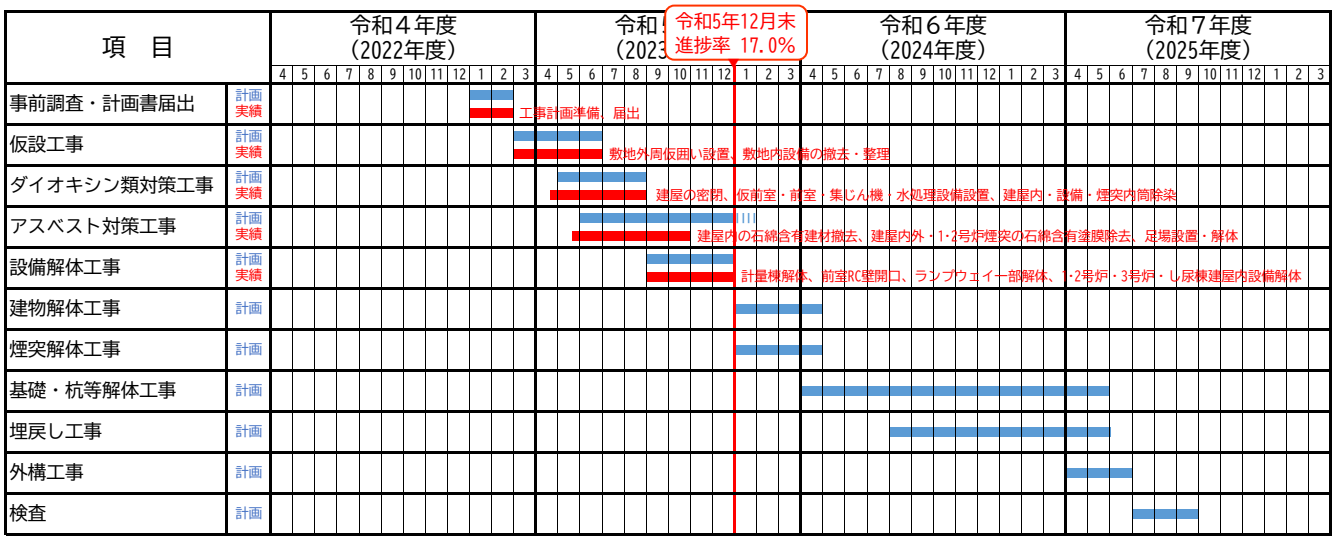

2　解体工事の施工状況・現況写真
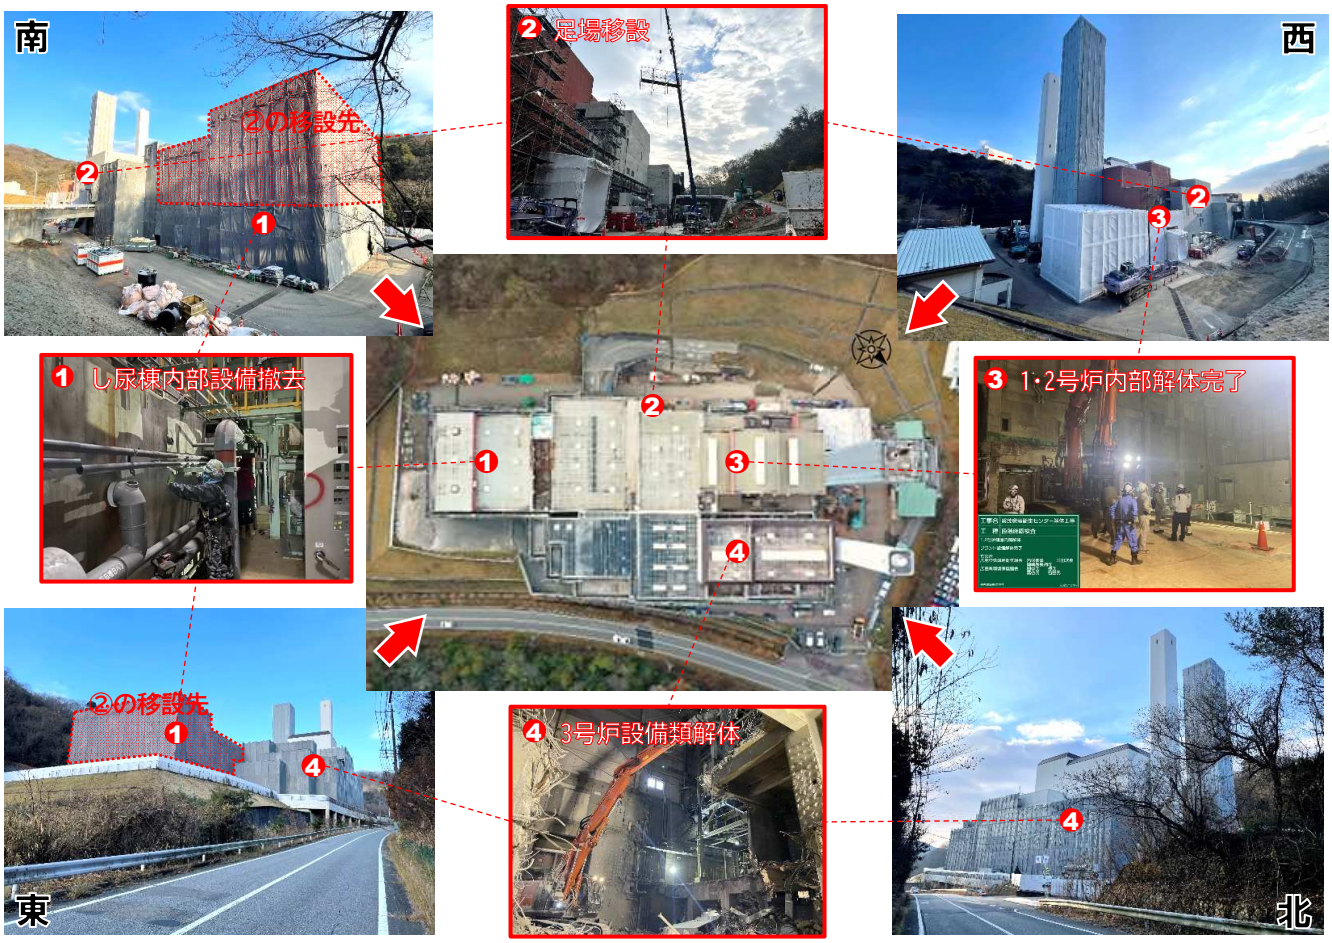
1･2号炉建屋内部の解体が完了したことにより、西面外部足場を一部解体し、北面及び南東面に足場を移設しています。
また、先月に引き続き、3号炉建屋内部設備類の解体及びし尿棟内部設備類の撤去を行っています。
