賀茂環境衛生センター解体工事の進捗状況について

（令和5年10月末現在）

1　全体スケジュール（計画・実績）

賀茂環境衛生センター解体工事は、令和４年度に着手し、令和７年度中に完了する予定です。
令和５年３月から仮設工事に着手し、令和５年５月から各種汚染物の除去作業を行った後、建物内の設備を解体し、順次、建物、煙突の解体を行い、基礎・杭の解体・除去、埋戻し作業、外構工事と行う計画です。

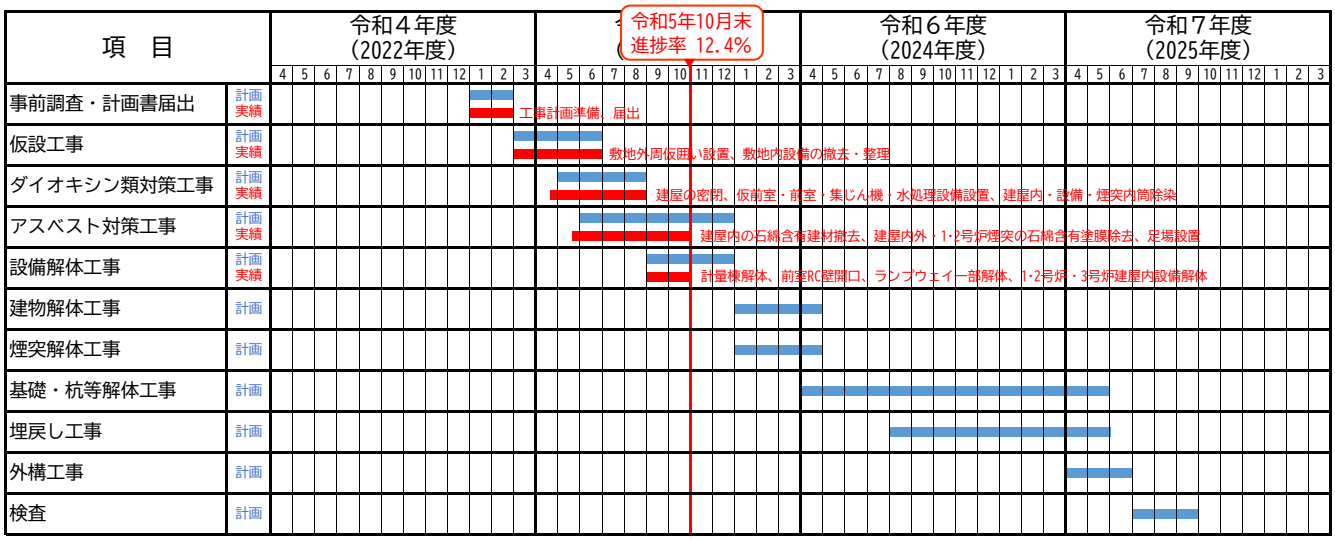

2　解体工事の施工状況・現況写真

引き続き建物外壁に足場を設置し、石綿含有塗膜部分の除去作業を行っています。また、建物内部の除染作業が完了したことにより、1･2号炉設備類は重機での解体を行っており、3号炉設備類の保温材撤去及び部分解体を開始しました。
