賀茂環境衛生センター解体工事の進捗状況について

（令和5年9月末現在）

1　全体スケジュール（計画・実績）

賀茂環境衛生センター解体工事は、令和４年度に着手し、令和７年度中に完了する予定です。
令和５年３月から仮設工事に着手し、令和５年５月から各種汚染物の除去作業を行った後、建物内の設備を解体し、順次、建物、煙突の解体を行い、基礎・杭の解体・除去、埋戻し作業、外構工事と行う計画です。

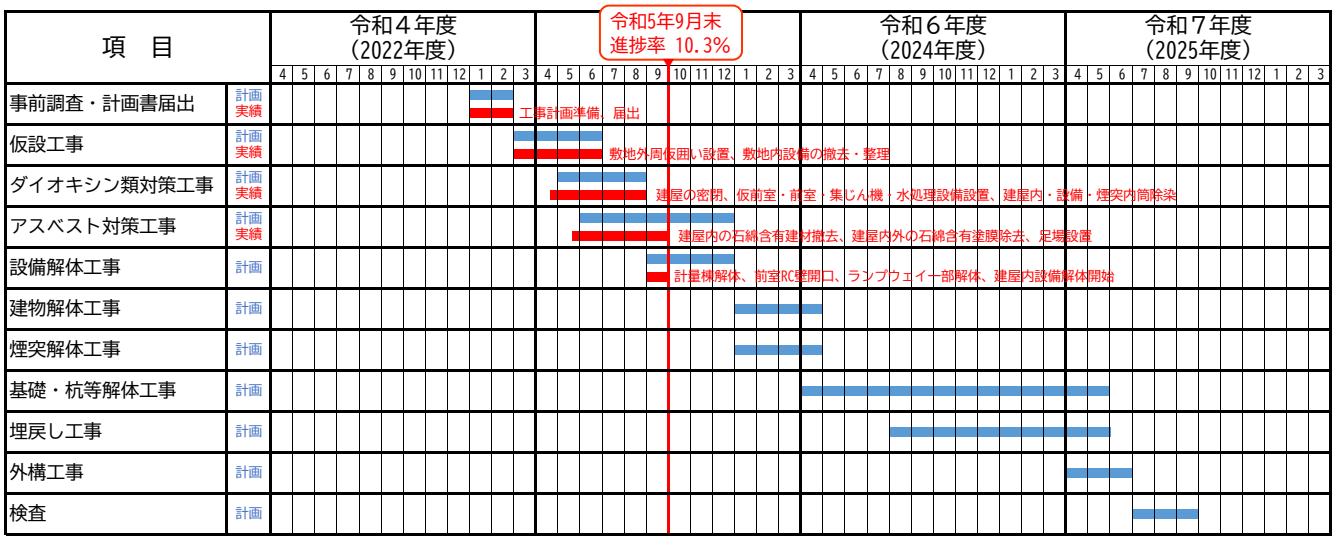

2　解体工事の施工状況・現況写真
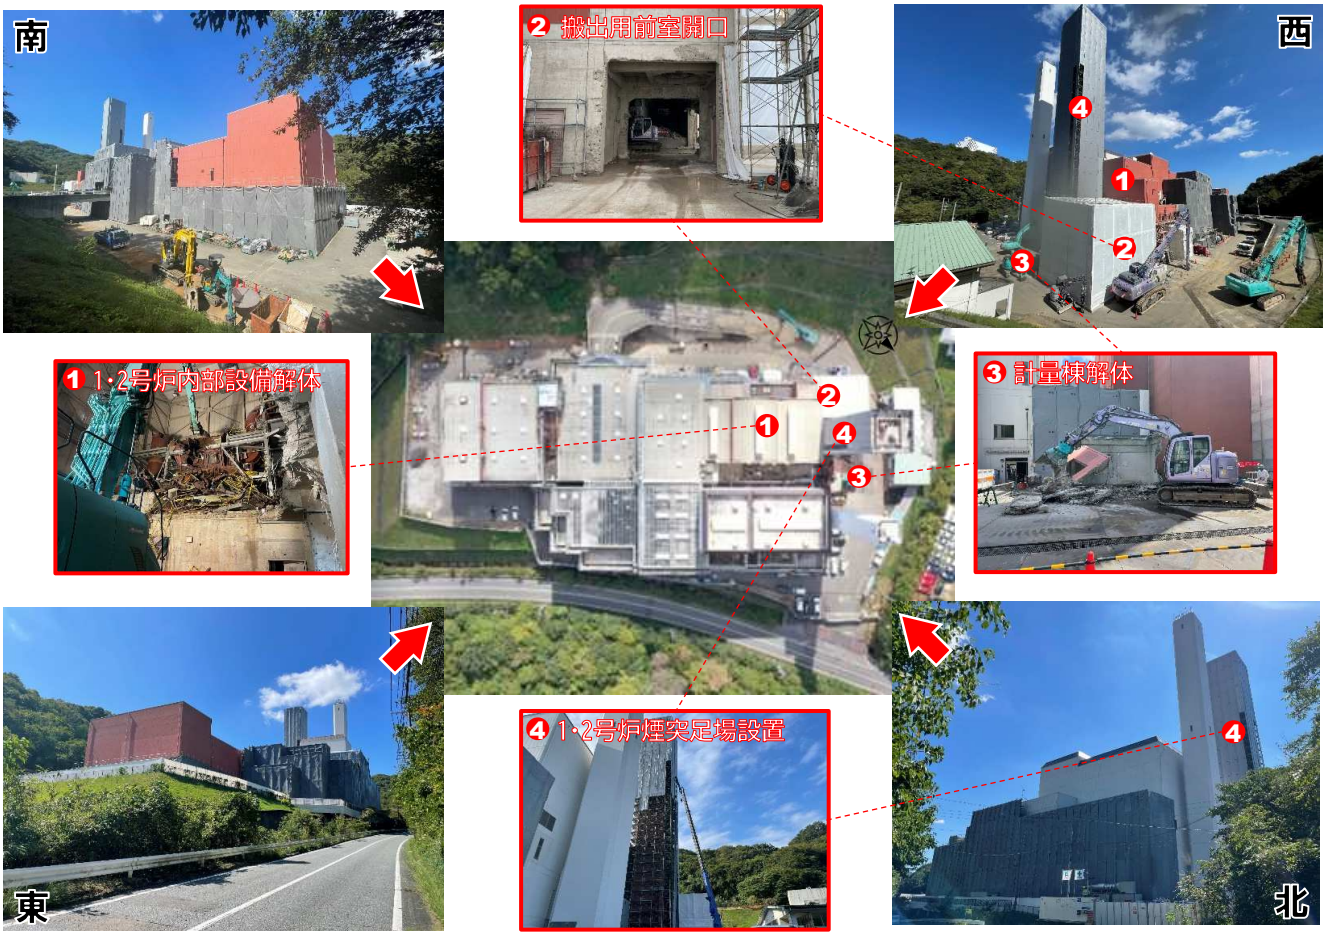
引き続き建物外壁・煙突に足場を設置し、石綿含有塗膜部分の除去作業を行っており、除去済みの計量棟を解体しました。
また、建物内部の除染作業が完了したことにより前室内壁を開口して重機を投入し、1･2号炉設備類の解体を開始しました。
